




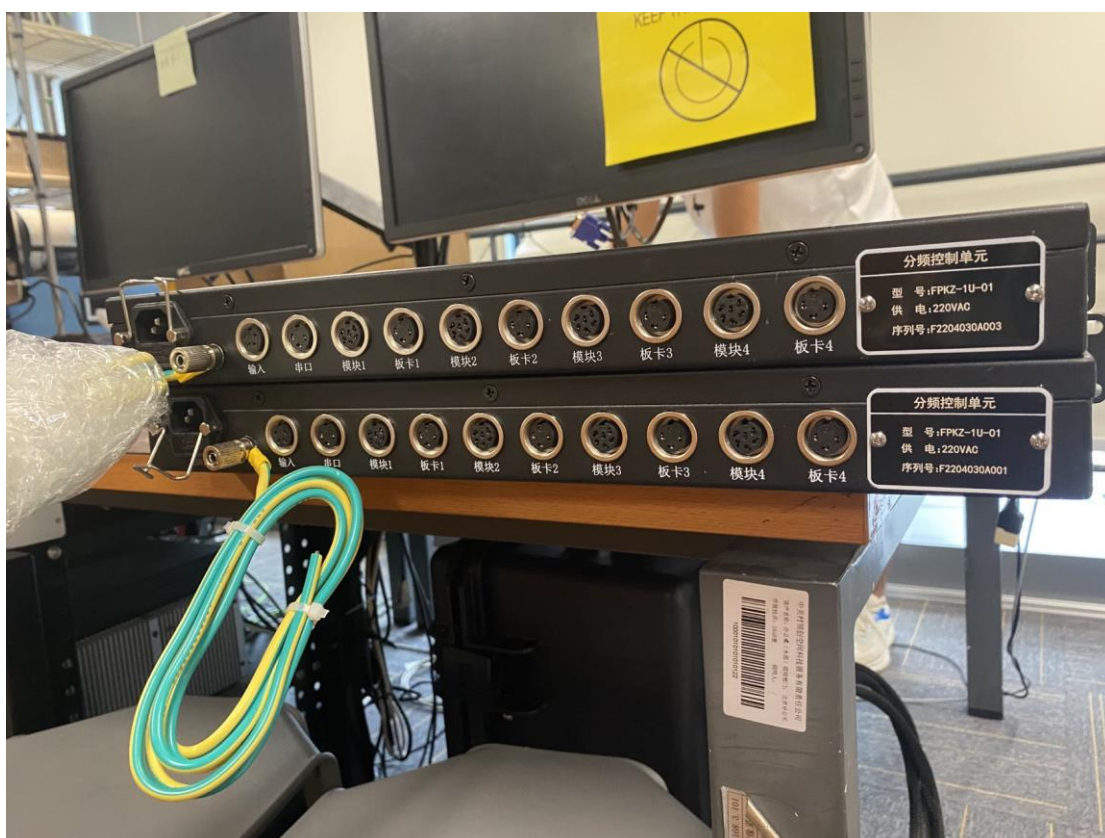

产品验收报告				
产品名称	成像控制单元			
客户名称	东方电子股份有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022年 8 月 9 日			
验收人员	韩园园			
序列号	F2204030A001			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	成像控制单元	FPKZ-1U-01	1 套	
2	电源线	220V AC	1 根	
3	信号输入线	定制	1 根	2 米
4	485 串口线	定制	1 根	2 米
5	板卡触发线	定制	1 根	2 米
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无划痕，产品及附件齐全		✓	
	主机及线缆的插头、插座安装稳定无损坏		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	线缆焊接定义无误		✓	
	连接功能正常的采集模块与采集主机，频率控制及数据采集功能正常		✓	
	分频控制范围为 1~99，倍频控制范围为 1~9		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	2K 模块在 0~50KHz（或 4K 模块在 0~26KHz）频率下外触发信号控制采集功能正常		✓	
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像效果正常，频率控制正常		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩园园			

产品验收报告				
产品名称	成像控制单元			
客户名称	东方电子股份有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022年 8 月 9 日			
验收人员	韩圆圆			
序列号	F2204030A003			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	成像控制单元	FPKZ-1U-01	1 套	
2	电源线	220V AC	1 根	
3	信号输入线	定制	1 根	2 米
4	485 串口线	定制	1 根	2 米
5	板卡触发线	定制	1 根	2 米
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无划痕，产品及附件齐全		✓	
	主机及线缆的插头、插座安装稳定无损坏		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	线缆焊接定义无误		✓	
	连接功能正常的采集模块与采集主机，频率控制及数据采集功能正常		✓	
	分频控制范围为 1~99，倍频控制范围为 1~9		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	2K 模块在 0~50KHz（或 4K 模块在 0~26KHz）频率下外触发信号控制采集功能正常		✓	
	24 小时 10KHz 烤机测试后图像效果正常，频率控制正常		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩圆圆			
